

(1) 实施工程表

工 事 名：配水管布設工事(耐震管4工区)													工 期		自 至		令和 8年 7月15日 令和 9年 3月18日						
工 種・項 目	数 量 (単位)	構成比率 (金額) %	月	7月			8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		摘 要
			日	10	15	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	18	
準 備 工	1.0 式	5.0%	100 %	実地			30(1.5)		90(4.5)	100(5.0)													～ 凡 例 ～ 施工進度管理(各月毎) — … 予 定 (黒) — … 変更予定(緑) — … 実績(赤) 全体工程管理 — … 予 定 (黒) — … 変更予定(緑) — … 実績(赤)
φ200布設工	413.1 m	34.9%		計画			30(1.5)		100(5.0)				30(10.5)	100(34.9)									
φ100布設工	42.6 m	2.8%	90 %	実地												100(2.8)							
φ50布設工	12.2 m	1.2%		計画													100(1.2)						
仕切弁設置工	7.0 基	3.4%	80 %	実地								14(0.5)		43(1.5)									
消火栓設置工	4.0 基	3.3%		計画									50(1.7)		100(3.3)								
空気弁設置工	2.0 基	1.7%	70 %	実地											100(1.7)								
離脱防止金具設置工	2.0 箇所	0.4%		計画																			
不断水バルブ設置工	2.0 基	6.2%	60 %	実地						100(0.4)													
給水管切替工	5.0 箇所	1.5%		計画						100(6.2)													
仮設配水管工	587.9 m	18.0%	50 %	実地							1(0.2)												
仮設給水管工	5.0 箇所	0.2%		計画							50(9.0)	70(12.6)						100(18.0)					
舗装復旧工	973.0 m ²	8.9%	40 %	実地								70(0.1)							100(0.2)				
附帯工	1.0 式	1.4%		計画																100(8.9)			
交通誘導工	203.0 人	6.1%	30 %	実地								20(0.3)		50(0.7)		80(1.1)			100(1.4)				
跡片付け	1.0 式	5.0%		計画																	100(6.1)		
			20 %	実地																	30(1.5)	100(5.0)	
				計画																			
			10 %	実地																			
				計画																			
			0 %	実地																			
全 体 (金 額) 工 程		100%	計画				1.5		5.0		21.7		39.5		69.7		78.6		85.5		96.5		100
			実績				1.5		4.5		5.3												
記 事 (指示・検討・是正事項)																							

10月の水道工事のお知らせ


[illegible]

※この工程はあくまで予定であり、天候や現場状況などにより変更となる場合があります。

施工者 浦上建設株式会社 0564-51-1460
担当：浦上隆司 090-1722-8531

10月工事予定表

—— 10月の施工予定箇所
—— 11月以降の施工予定箇所

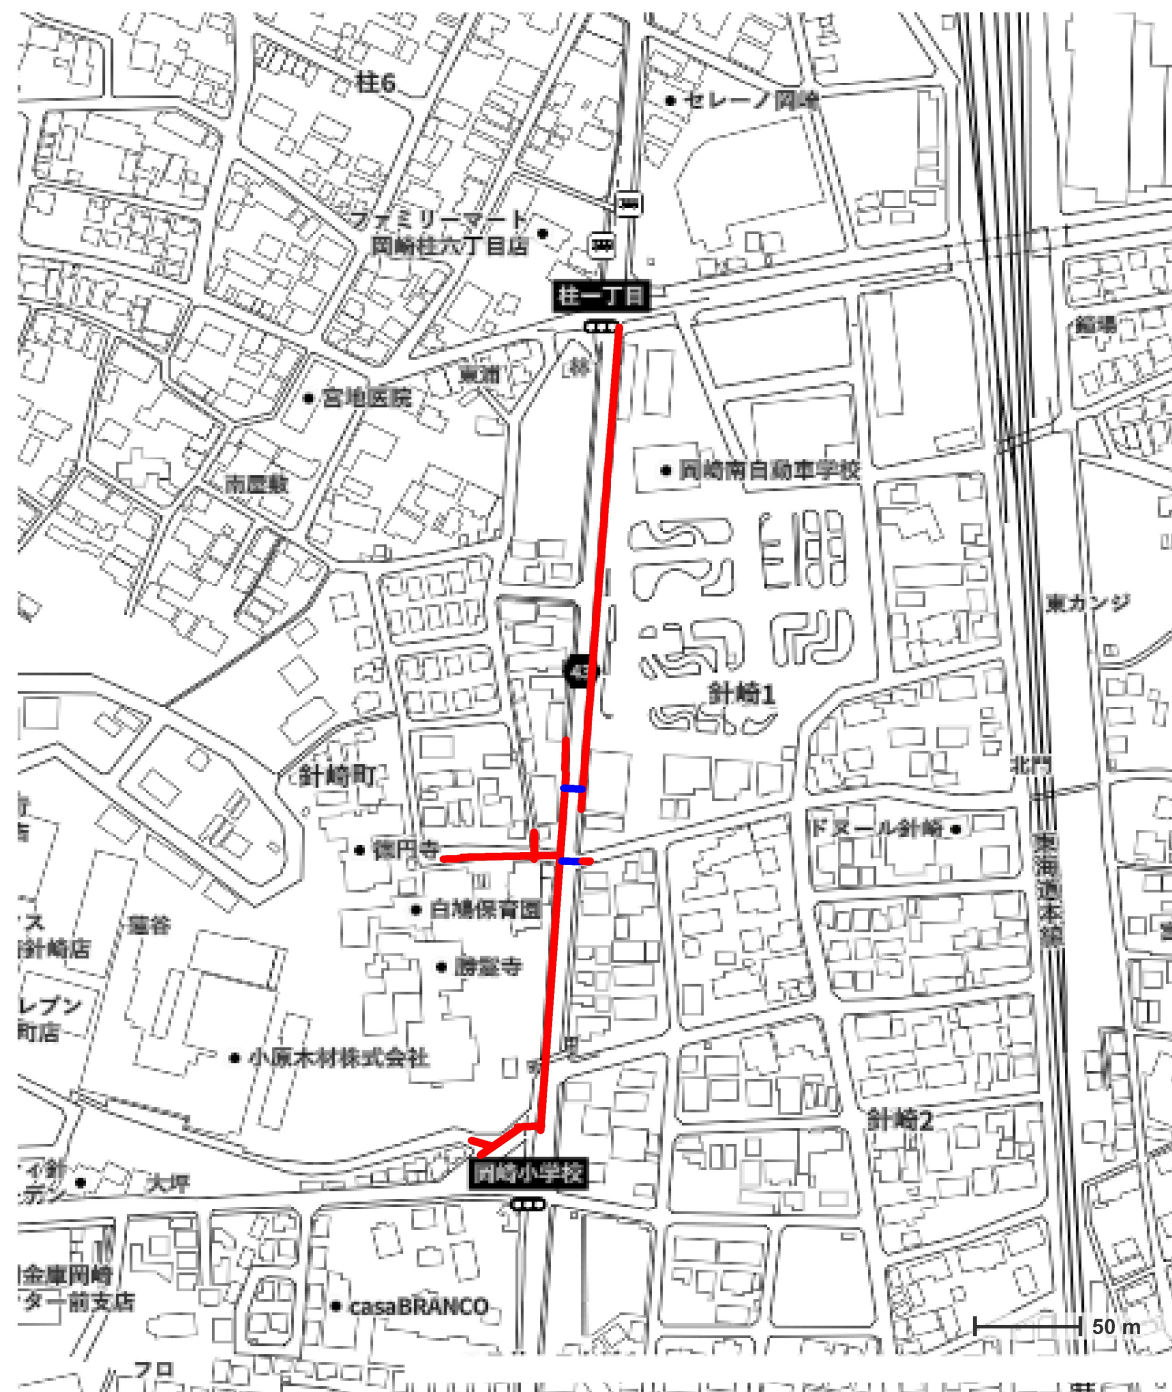

※工事の特性上、同じ場所を何度も施工します。ご理解願います。



URA : urakamikensetu/shinchoku/

工事の予定はこちらから

ご覧いただけます

(每月末更新)
