浦上建設株式会社　配水管布設工事（週休2日）河原町地内　　10月度進捗状況

(1) 実 施 工 程　　工事概要　　φ100 DIP-E(GX) L=588.5m　φ50PE L=279m


工 事 名 ： 配水管布設工事(週休2日)　　工 期 自　令和　8年 3月　17日

岡崎市河原町地内　　至　令和　9年 3月　12日

浦 上 建 設 株 式 会 社

現場代理人　　西口　徹

工 種 ・ 項 目	数 量 (単位)	構成比率 (金額) %
準 備 工	1.0 式	5.0%
φ100布設工	600.7 m	21.3%
φ50布設工	279.0 m	8.4%
仕切弁設置工	23.0 箇所	6.4%
消火栓設置工	2.0 箇所	3.0%
離脱防止金具設置工	2.0 箇所	2.2%
不断水バルブ設置工	5.0 箇所	5.3%
給水管切替工	50.0 箇所	6.5%
仮設配水管工	1,559.3 m	10.1%
仮設給水管工	50.0 箇所	3.6%
舗装復旧工	2,220.0 ㎡	11.2%
付帯工	1.0 式	3.8%
交通誘導工	1.0 式	8.2%
後片付け工	1.0 式	5.0%
全 体 （ 金 額 ） 工 程		100%

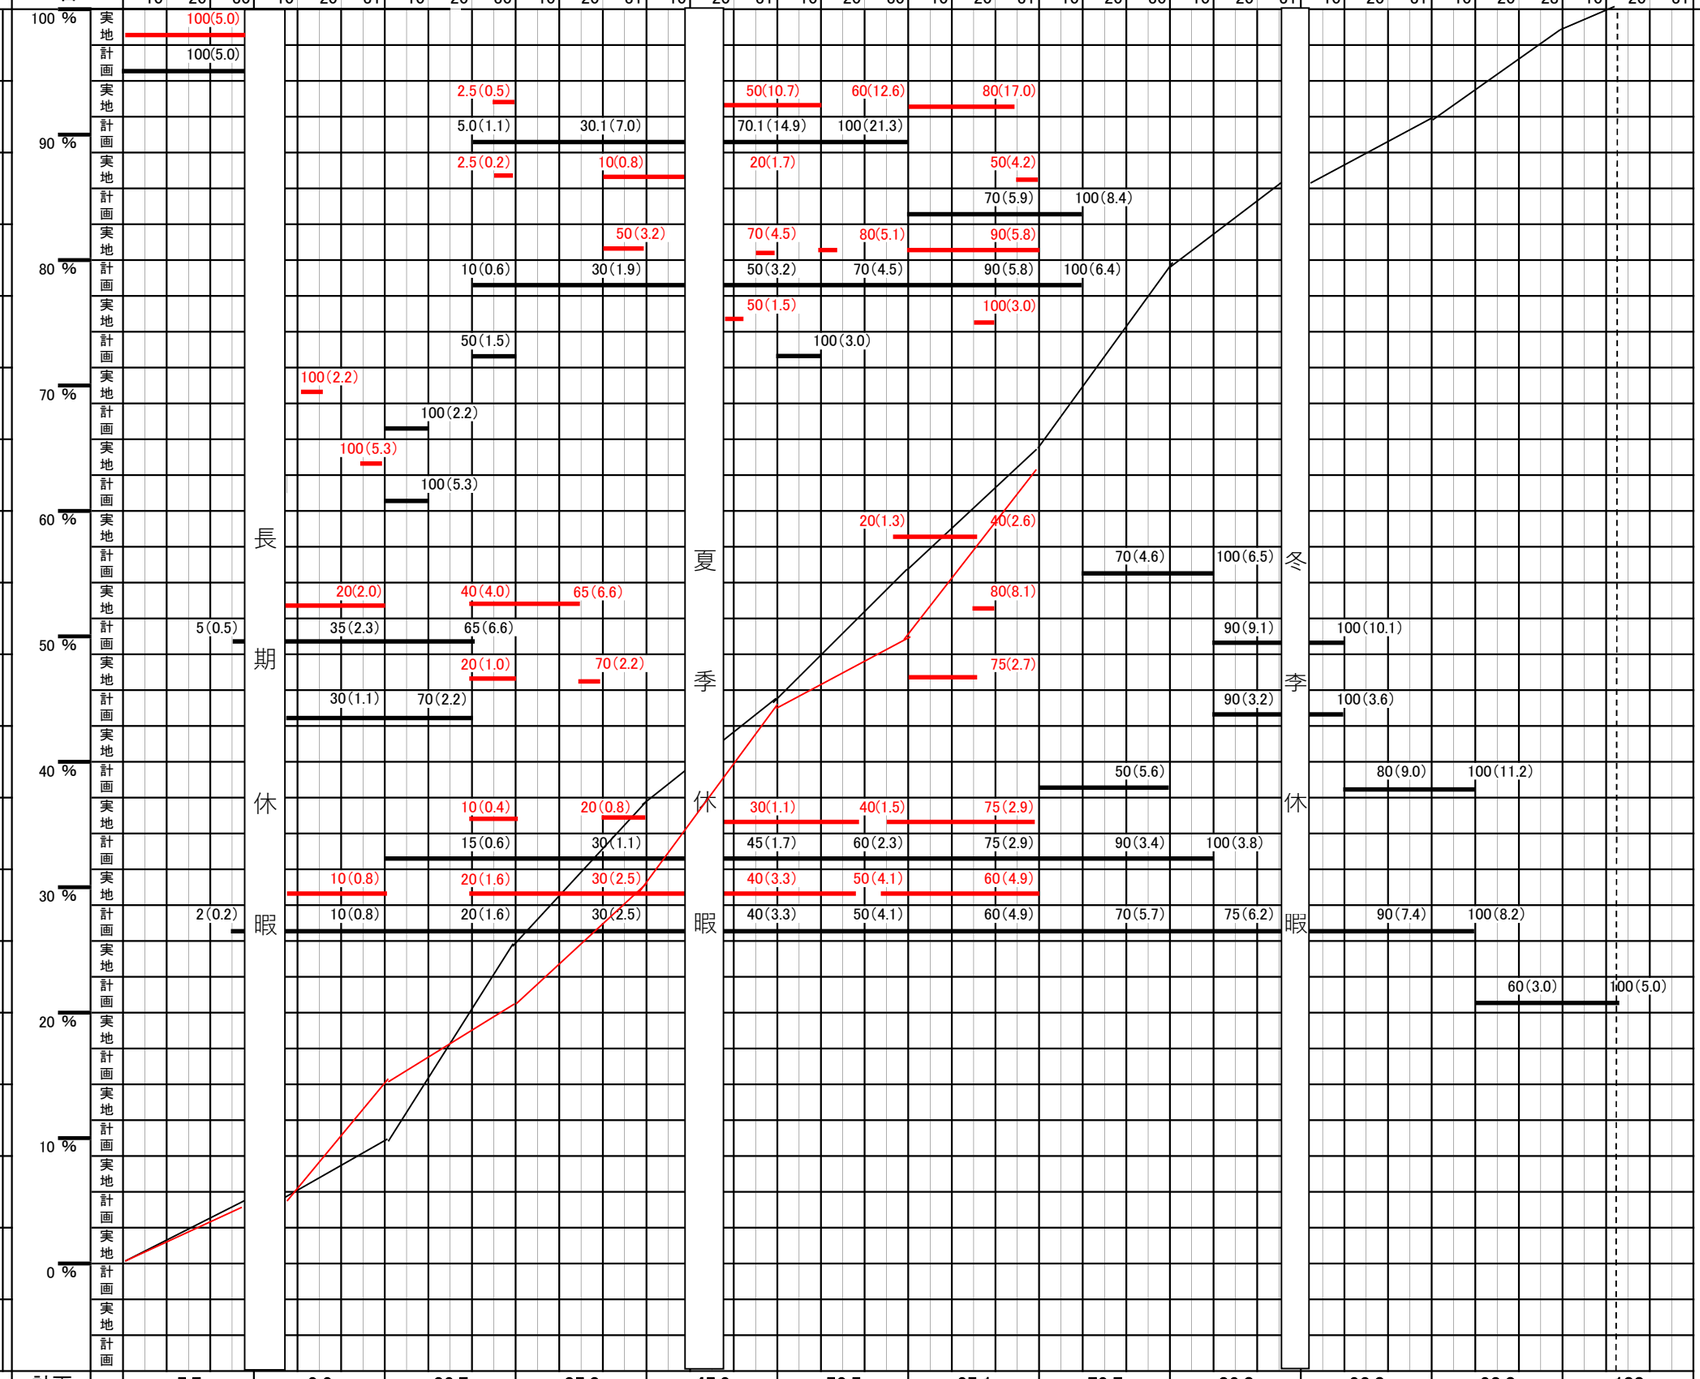

全体（金額）工程		5.7	9.9	26.7	35.3	45.9	56.5	65.1	79.7	86.0	92.0	98.0	100
	計画	5.7	9.9	26.7	35.3	45.9	56.5	65.1	79.7	86.0	92.0	98.0	100
	実績	5.0	15.3	20.2	29.1	44.1	49.1	63.7					

記　　事
（指示・検討・是正事項）

摘　　要

～ 凡　例 ～

施工進度管理(各月毎)

… 予 定　(黒)

… 変更予定(緑)

… 実 績(赤)


全体工程管理

… 予 定　(黒)

… 変更予定(緑)

… 実 績(赤)

配水管布設工事（週休2日）　河原町地内　10月度進捗状況及び11月度施工予定箇所

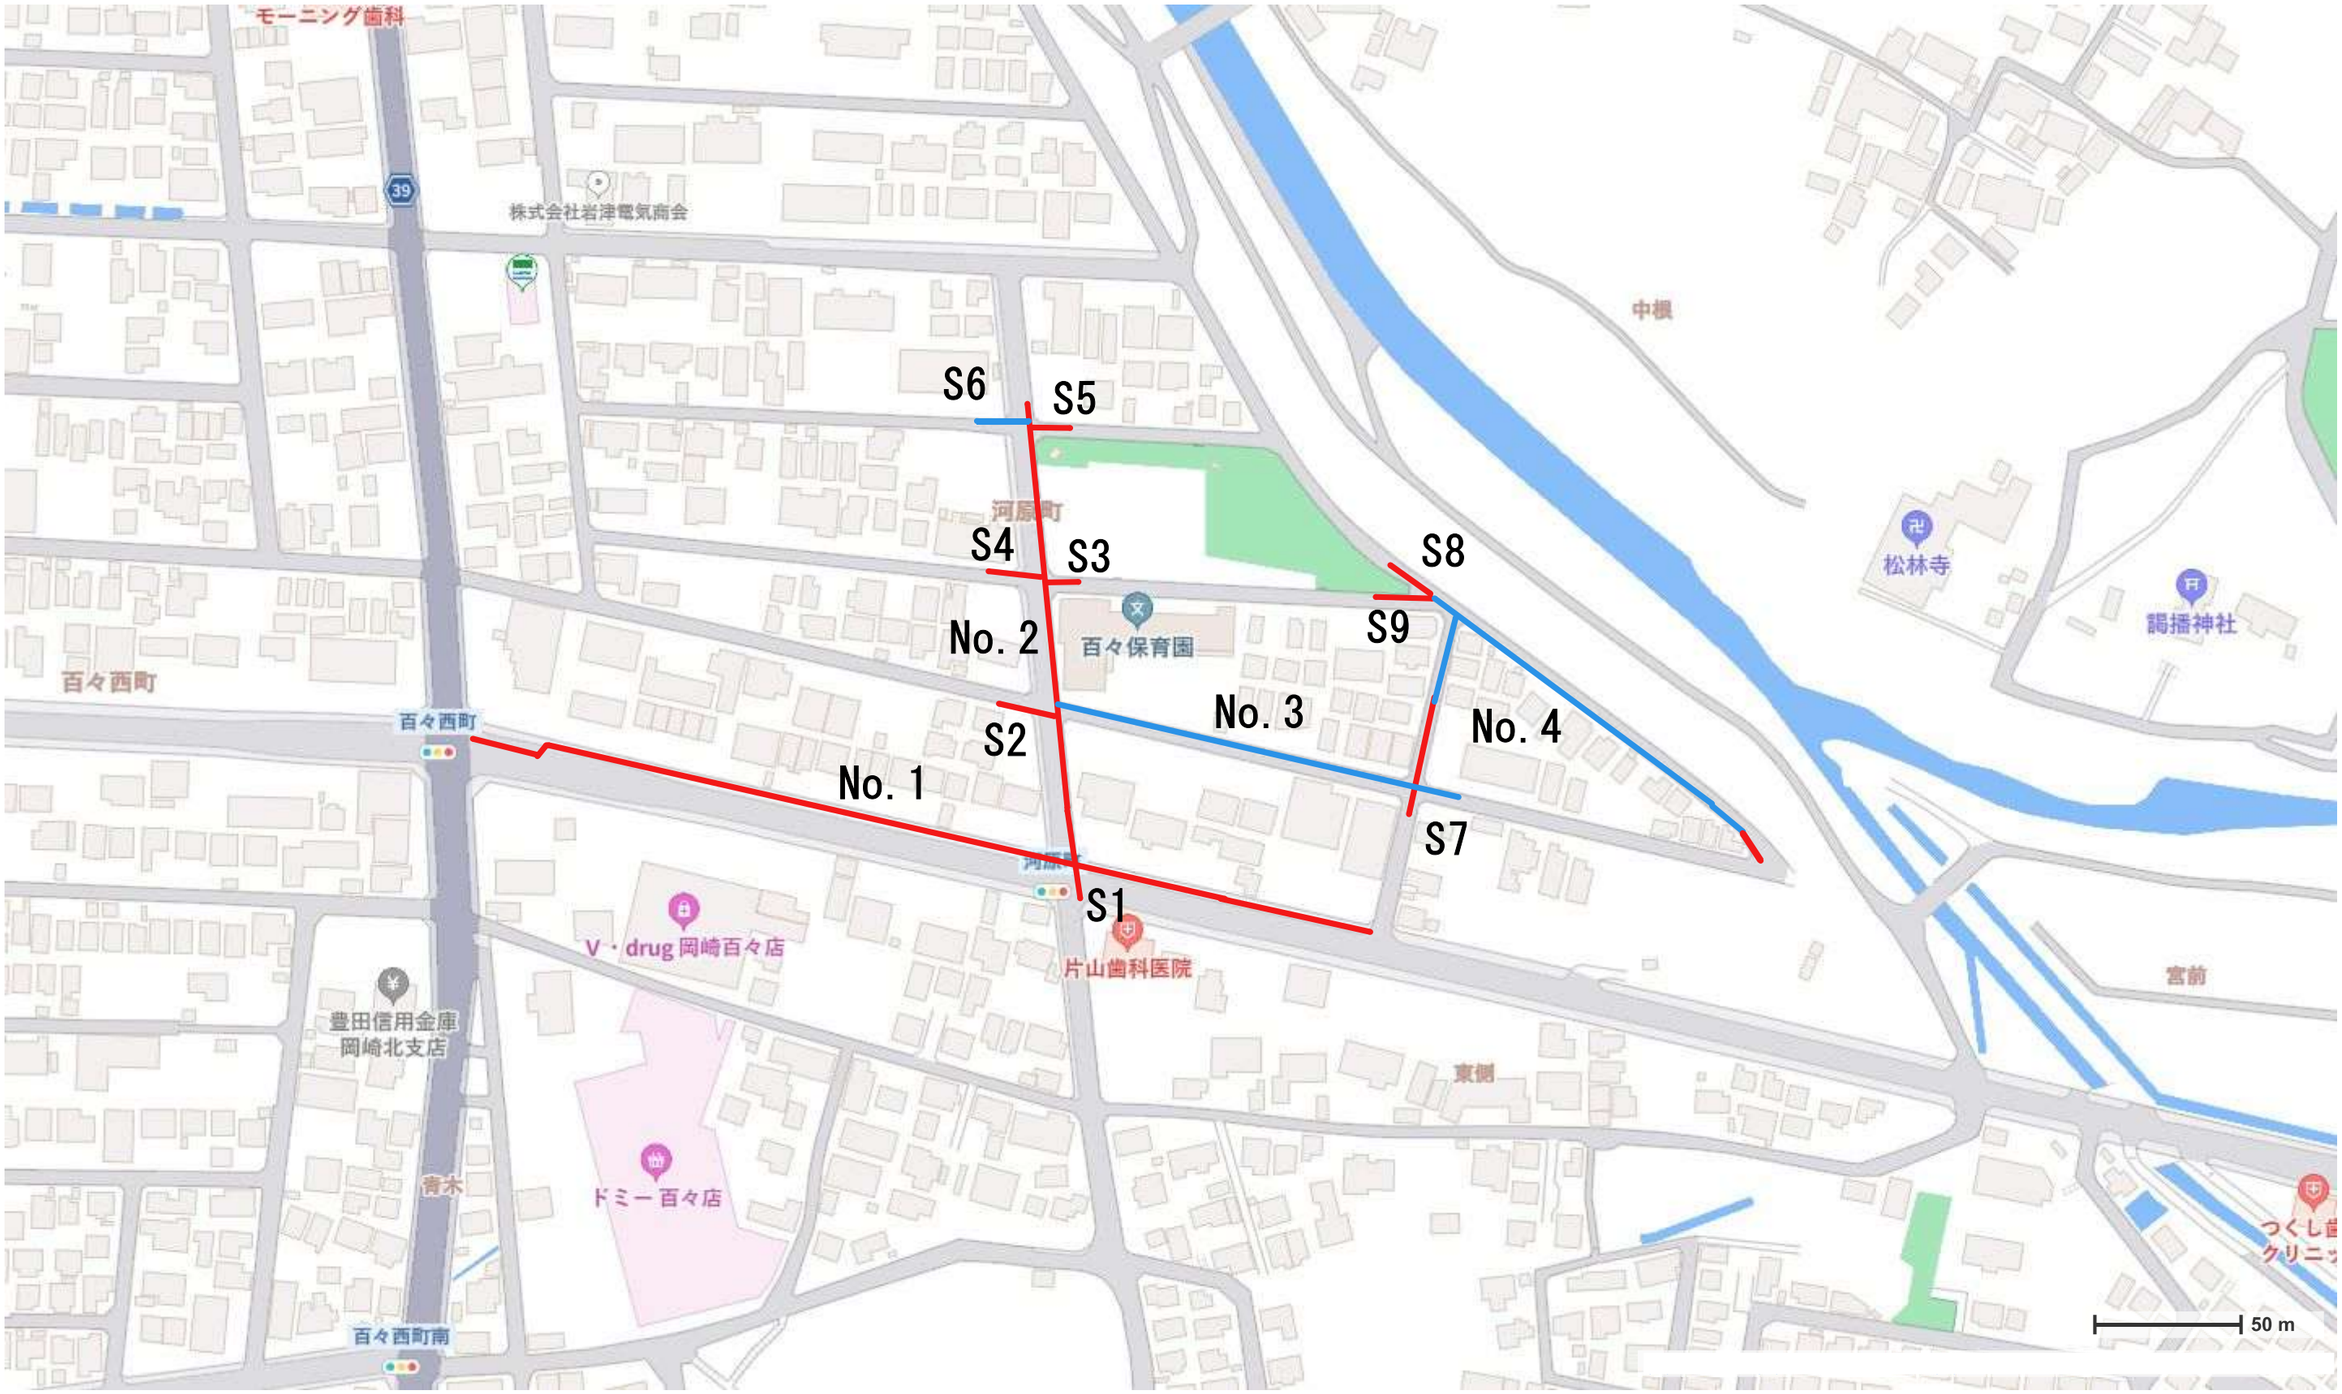

施工予定箇所

施工完了個所

浦上建設株式会社
